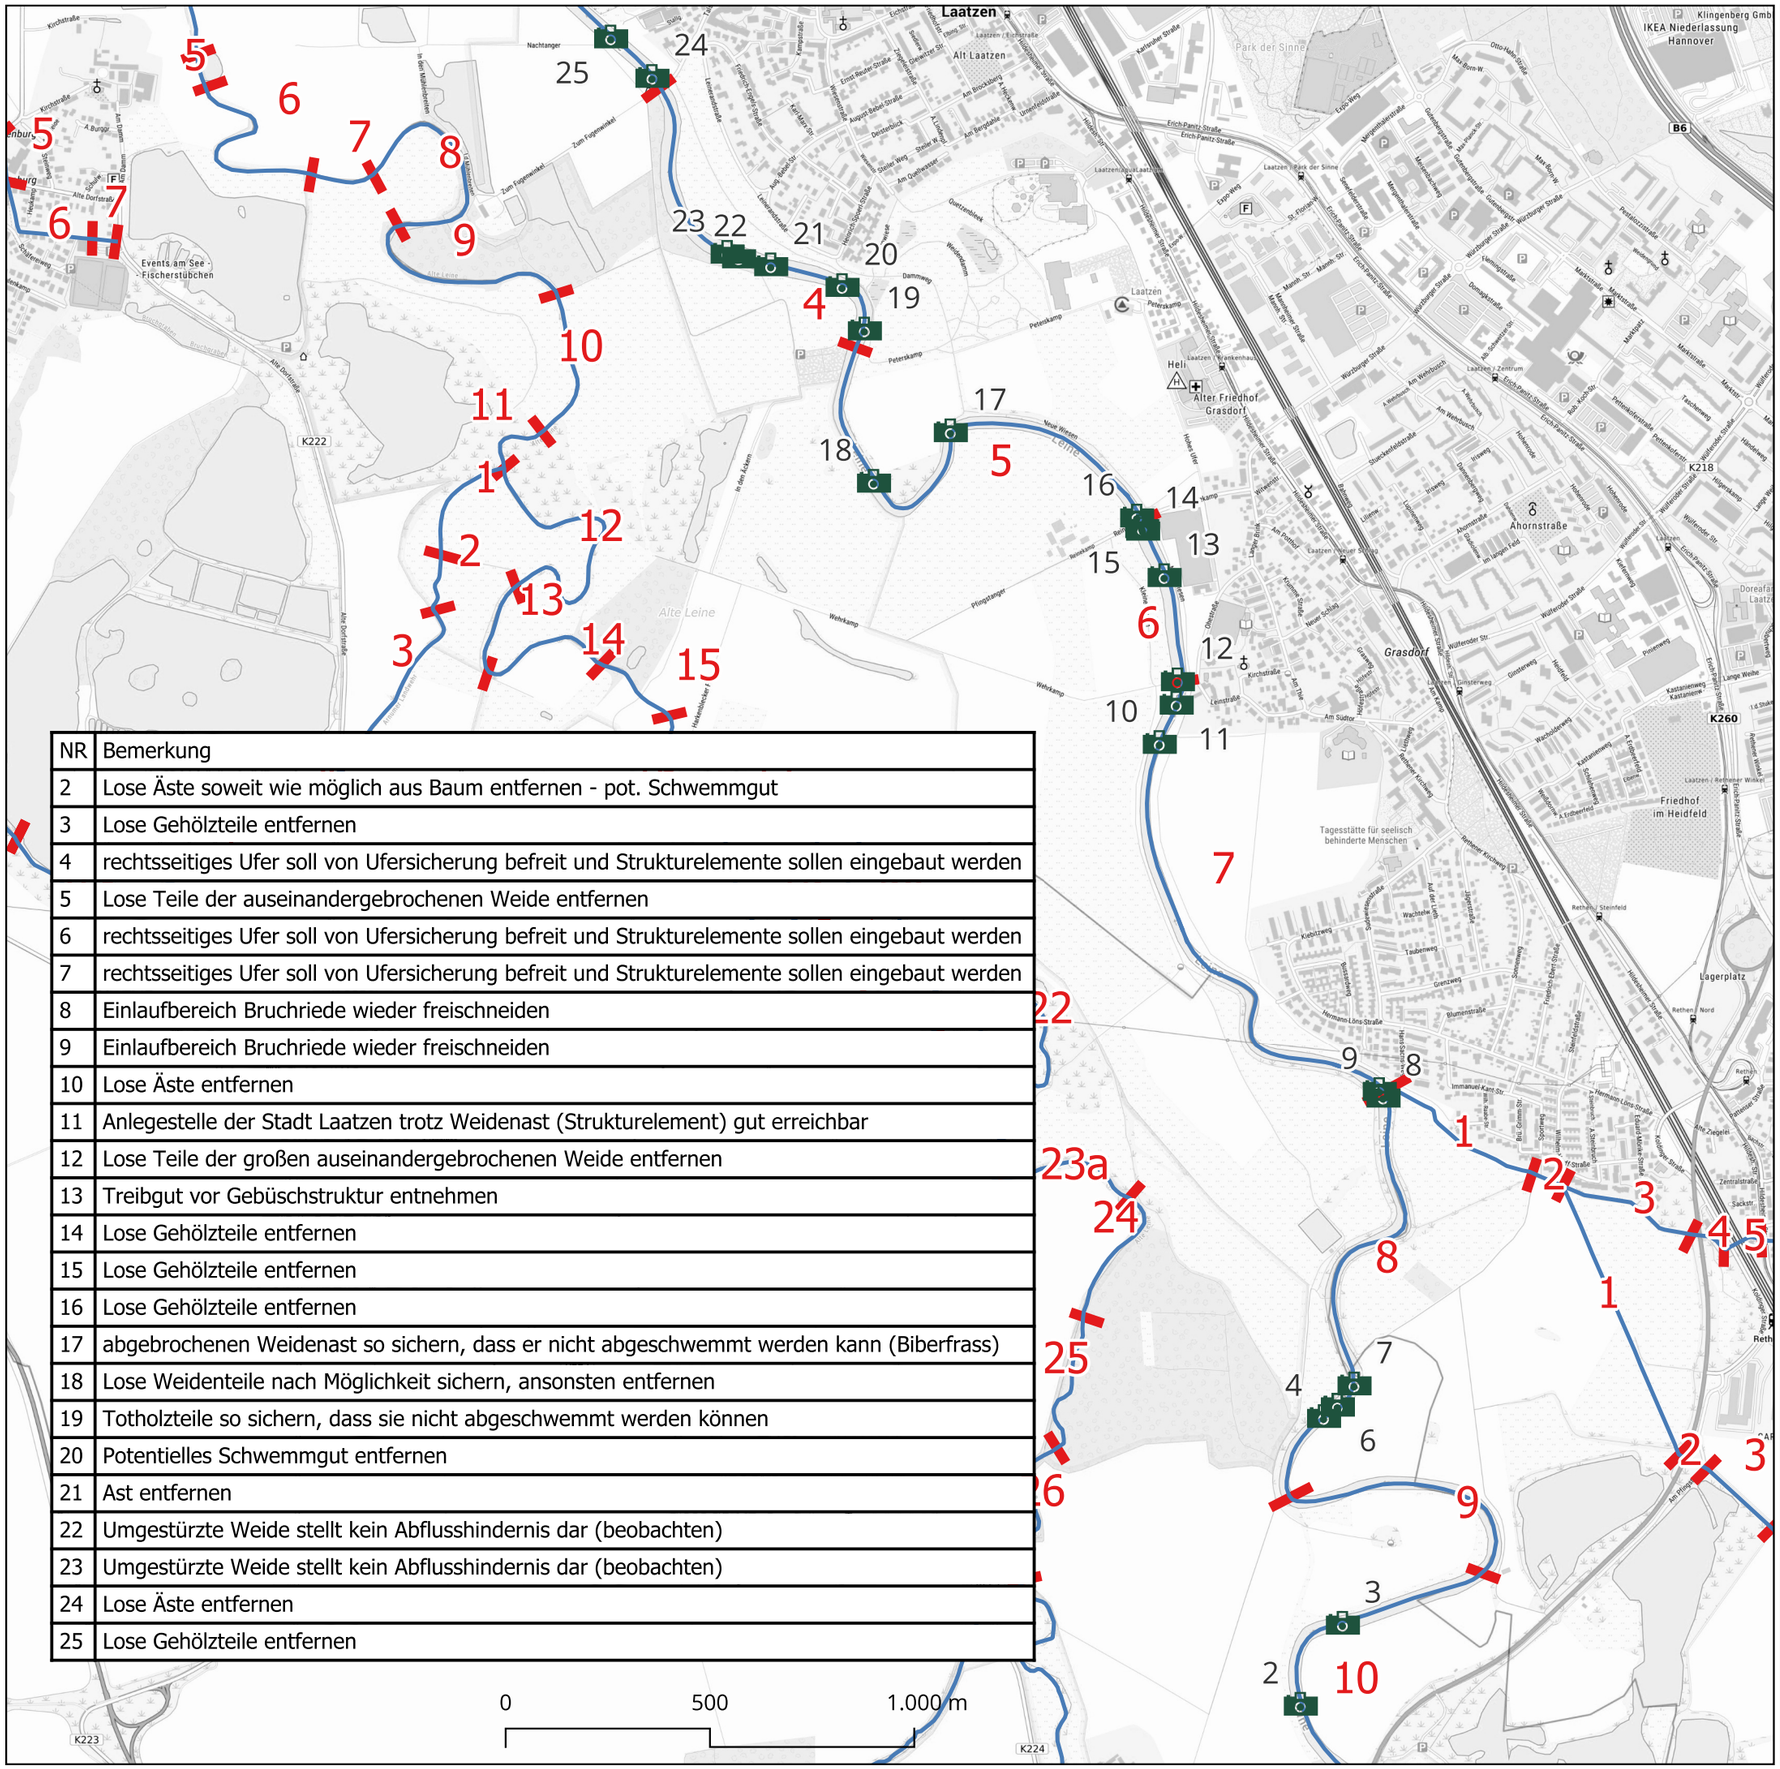

NR	Bemerkung
2	Lose Äste soweit wie möglich aus Baum entfernen - pot. Schwemmgut
3	Lose Gehölzteile entfernen
4	rechtsseitiges Ufer soll von Ufersicherung befreit und Strukturelemente sollen eingebaut werden
5	Lose Teile der auseinandergebrochenen Weide entfernen
6	rechtsseitiges Ufer soll von Ufersicherung befreit und Strukturelemente sollen eingebaut werden
7	rechtsseitiges Ufer soll von Ufersicherung befreit und Strukturelemente sollen eingebaut werden
8	Einlaufbereich Bruchriede wieder freischneiden
9	Einlaufbereich Bruchriede wieder freischneiden
10	Lose Äste entfernen
11	Anlegestelle der Stadt Laatzen trotz Weidenast (Strukturelement) gut erreichbar
12	Lose Teile der großen auseinandergebrochenen Weide entfernen
13	Treibgut vor Gebüschstruktur entnehmen
14	Lose Gehölzteile entfernen
15	Lose Gehölzteile entfernen
16	Lose Gehölzteile entfernen
17	abgebrochenen Weidenast so sichern, dass er nicht abgeschwemmt werden kann (Biberfrass)
18	Lose Weidenteile nach Möglichkeit sichern, ansonsten entfernen
19	Totholzteile so sichern, dass sie nicht abgeschwemmt werden können
20	Potentielles Schwemmgut entfernen
21	Ast entfernen
22	Umgestürzte Weide stellt kein Abflusshindernis dar (beobachten)
23	Umgestürzte Weide stellt kein Abflusshindernis dar (beobachten)
24	Lose Äste entfernen
25	Lose Gehölzteile entfernen

Zeichenerklärung

- Handlungsbedarf (Fotostandorte)
- Stationierung (500 m)
- Gewässerverlauf
- Pflegeabschnitte (nummeriert)

Gewässerschau 2023

Leine (Koldingen bis Laatzen)

Anlage 2

Datum:	08/06/2023
Bearbeiter:in:	Melanie Bruns
Projektnummer:	52-2471

Maßstab 1:15.000

Gewässer- und Landschaftspflege-verband Mittlere Leine
Marktstr. 33
30890 Barsinghausen

GLV 52 Mittlere Leine

Kartengrundlagen: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2022), Datenquellen: https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_ Open.pdf | ETRS89 / UTM zone 32N
